CEL Lavizzara SA
Impianto idroelettrico Tomé

Programma generale di progettazione e di realizzazione
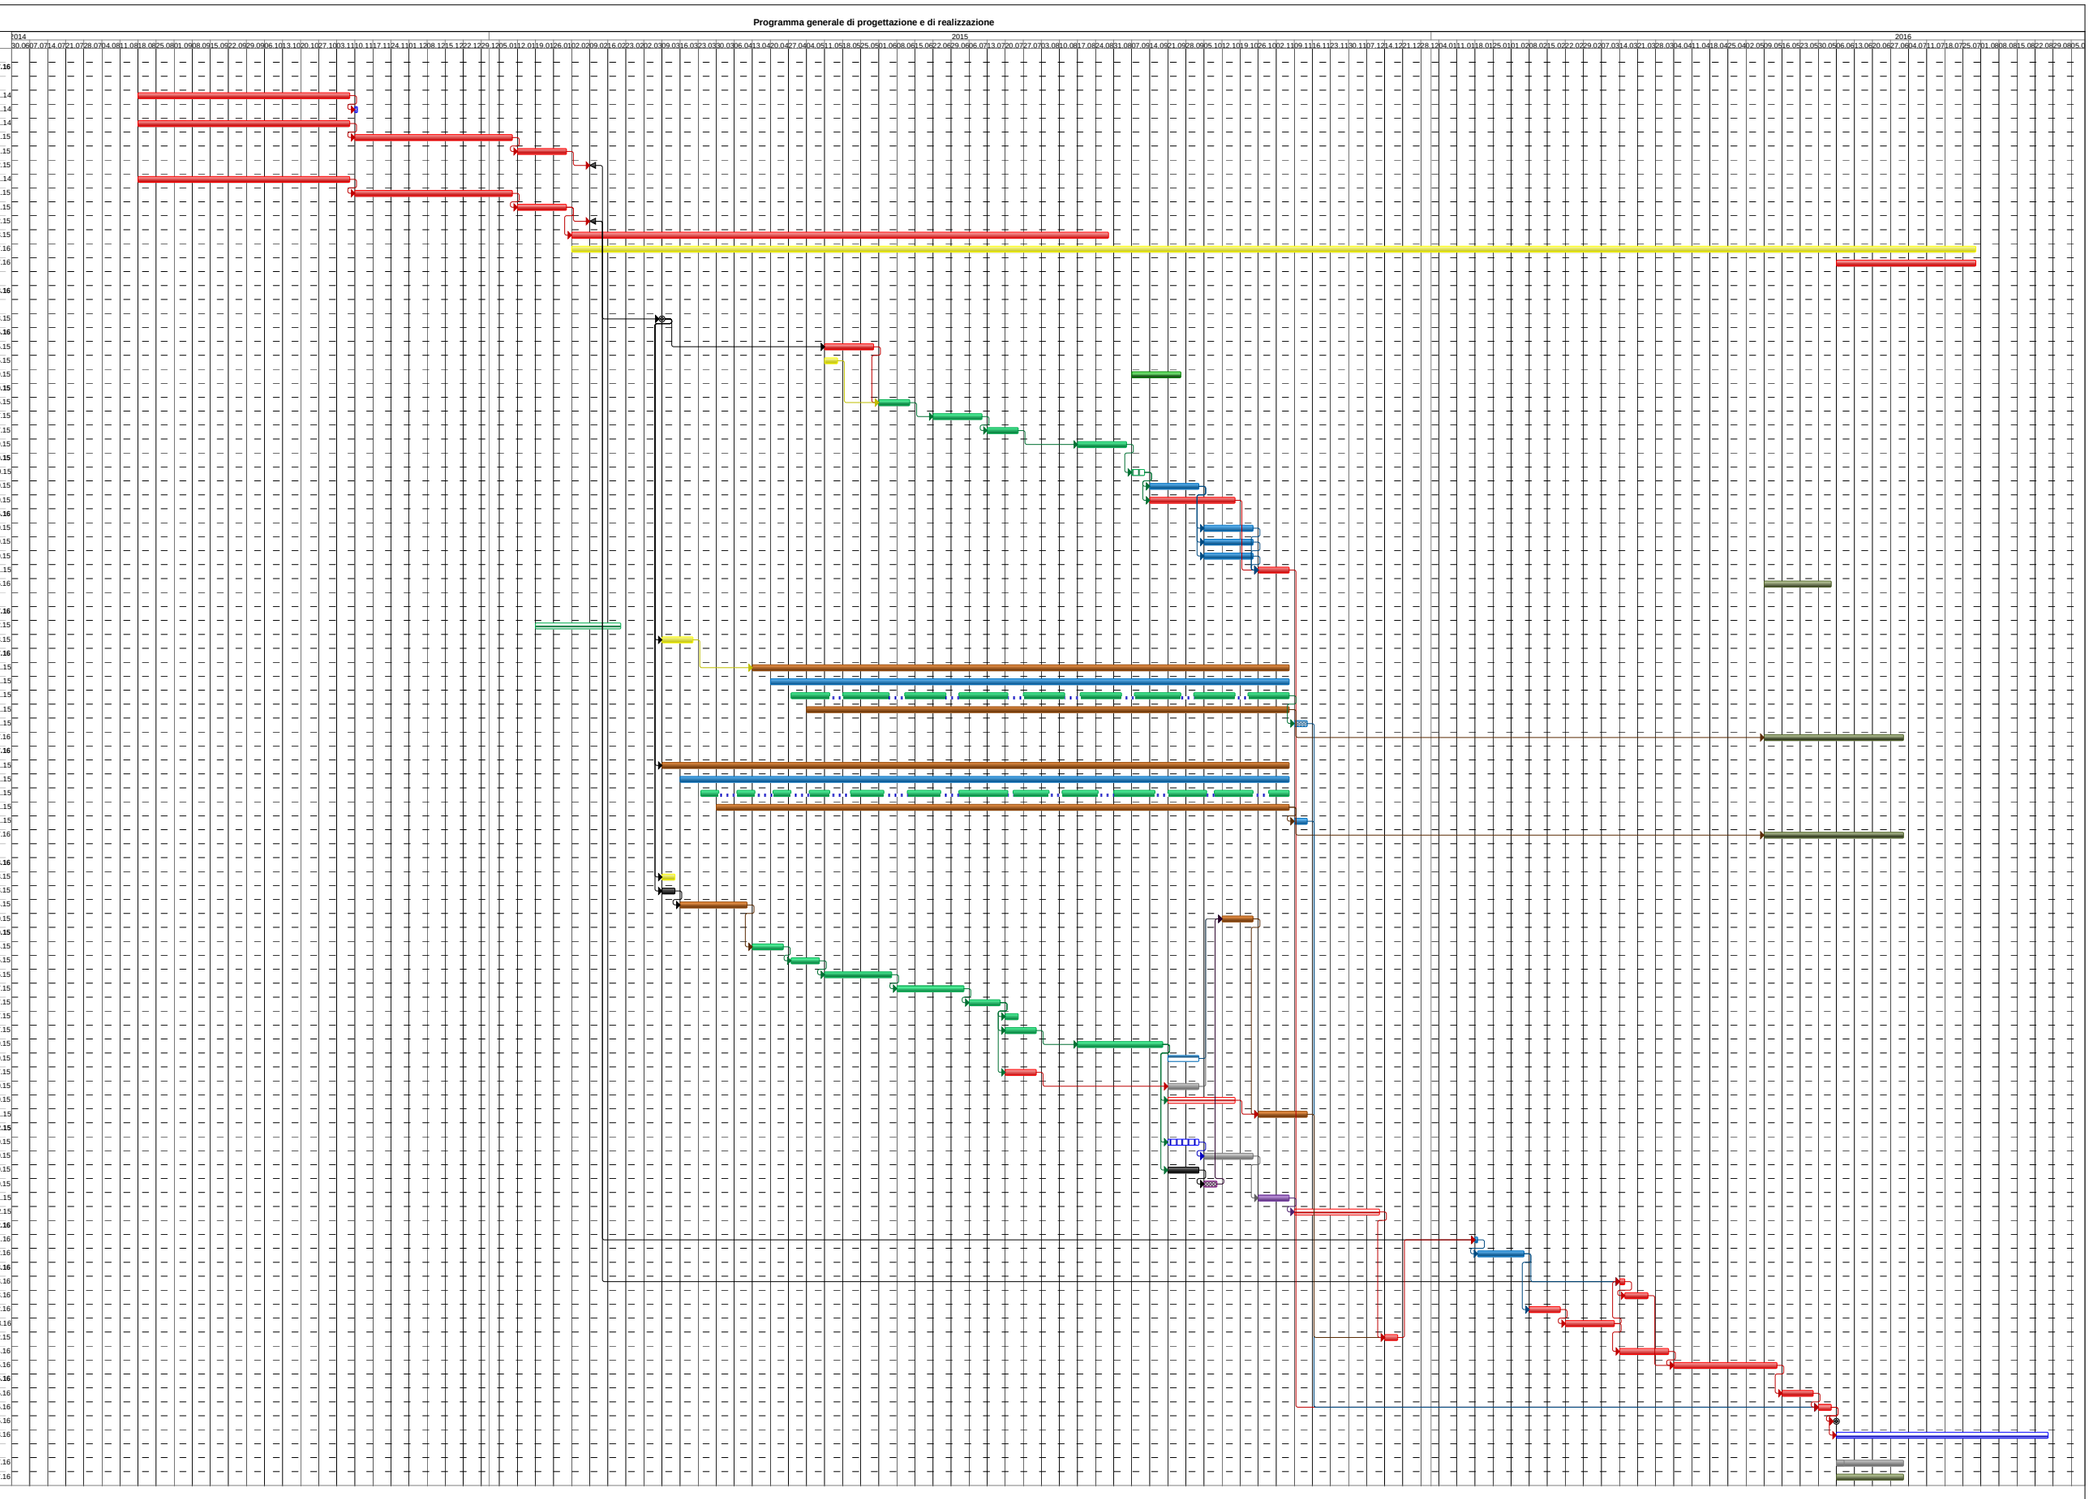
Impianto sull'acquedotto; Centrale di Sigirino	Inizio	Fine
A. Progettazione e direzione lavori	**lun 18.08.14**	**ven 29.07.16**
Elaborazione domanda di costruzione	lun 18.08.14	ven 07.11.14
Inoltrare domande di costruzione	lun 10.11.14	lun 10.11.14
Appalti parte civile	lun 18.08.14	ven 07.11.14
Submissione	lun 10.11.14	ven 09.01.15
Valutazione	lun 12.01.15	ven 30.01.15
Delibera	lun 09.02.15	lun 09.02.15
Appalti parte elettromeccanica	lun 18.08.14	ven 07.11.14
Submissione	lun 10.11.14	ven 09.01.15
Valutazione	lun 12.01.15	ven 30.01.15
Delibera	lun 09.02.15	lun 09.02.15
Progetto esecutivo	lun 02.02.15	ven 28.08.15
Direzione lavori	lun 02.02.15	ven 29.07.16
Consegna e documentazione	lun 06.06.16	ven 29.07.16
B. Programma di lavoro	**lun 19.01.15**	**ven 26.08.16**
Inizio lavori genio civile	lun 09.03.15	lun 09.03.15
1. Presa d'acqua	**lun 11.05.15**	**ven 03.06.16**
Lavori di scavo	lun 11.05.15	ven 29.05.15
Installazioni	lun 11.05.15	ven 15.05.15
Reinterro delle opere	lun 07.09.15	ven 25.09.15
Lavori di calcestruzzo	**lun 01.06.15**	**ven 04.09.15**
Platea quota	lun 01.06.15	ven 12.06.15
Pareti quota	lun 22.06.15	ven 10.07.15
Soletta quota	lun 13.07.15	ven 24.07.15
Briglia	lun 17.08.15	ven 04.09.15
Lavori di artigani	**lun 07.09.15**	**ven 16.10.15**
Lavori di rivestimento	lun 07.09.15	ven 11.09.15
Lavori di carpenteria metallica	lun 14.09.15	ven 02.10.15
Lavori di installazioni elettriche	lun 14.09.15	ven 16.10.15
Equipaggiamento idromeccanico	**lun 05.10.15**	**ven 03.06.16**
Valvola farfalla	lun 05.10.15	ven 23.10.15
Misuratore di portata	lun 05.10.15	ven 23.10.15
Paratoie	lun 05.10.15	ven 23.10.15
Messa in servizio equipaggiamento idromeccanico	lun 26.10.15	ven 06.11.15
Lavori di sistemazione esterna	lun 09.05.16	ven 03.06.16
2. Condotta forzata	**lun 19.01.15**	**ven 01.07.16**
Lavori di disboscamento	lun 19.01.15	ven 20.02.15
Installazioni	lun 09.03.15	ven 20.03.15
1° Parte superiore	**lun 13.04.15**	**ven 01.07.16**
Lavori di scavo	lun 13.04.15	ven 06.11.15
Fornitura e posa della condotta	lun 20.04.15	ven 06.11.15
Opere di calcestruzzo	mar 28.04.15	ven 06.11.15
Reinterro della condotta	lun 04.05.15	ven 06.11.15
Prova di pressione	lun 09.11.15	ven 13.11.15
Lavori di sistemazione esterna	lun 09.05.16	ven 01.07.16
2° Parte inferiore	**lun 09.03.15**	**ven 01.07.16**
Lavori di scavo	lun 09.03.15	ven 06.11.15
Fornitura e posa della condotta	lun 16.03.15	ven 06.11.15
Opere in calcestruzzo	mar 24.03.15	ven 06.11.15
Reinterro della condotta	lun 30.03.15	ven 06.11.15
Prova di pressione	lun 09.11.15	ven 13.11.15
Lavori di sistemazione esterna	lun 09.05.16	ven 01.07.16
3. Centrale	**lun 09.03.15**	**ven 26.08.16**
Installazioni	lun 09.03.15	ven 13.03.15
Strada di accesso	lun 09.03.15	ven 13.03.15
Lavori di scavo	lun 16.03.15	ven 10.04.15
Reinterro delle opere	lun 12.10.15	ven 23.10.15
Opere di calcestruzzo	**lun 13.04.15**	**ven 02.10.15**
Canale di scarico	lun 13.04.15	ven 24.04.15
Platea e pareti quota	mar 28.04.15	ven 08.05.15
Platea quota	lun 11.05.15	ven 05.06.15
Pareti quota	lun 08.06.15	ven 03.07.15
Soletta quota	lun 06.07.15	ven 17.07.15
Parapetti soletta	lun 20.07.15	ven 24.07.15
Platea muro piazzale	lun 20.07.15	ven 31.07.15
Muro piazzale	lun 17.08.15	ven 18.09.15
Tubi di drenaggio	lun 21.09.15	ven 02.10.15
Muratura esterna	lun 20.07.15	ven 31.07.15
Intonaco di facciata	lun 21.09.15	ven 02.10.15
Bauletto cavi	lun 21.09.15	ven 16.10.15
Piazzale e strada di accesso	lun 26.10.15	ven 13.11.15
Lavori di artigiano	**lun 21.09.15**	**ven 11.12.15**
Lavori di carpenteria metallica	lun 21.09.15	ven 02.10.15
Betoncino	lun 05.10.15	ven 23.10.15
Lavori di impermeabilizzazione	lun 21.09.15	ven 02.10.15
Lavori di lattoniere	lun 05.10.15	ven 09.10.15
Lavori di pittore	lun 26.10.15	ven 06.11.15
Lavori di installazioni elettriche	lun 09.11.15	ven 11.12.15
Turbina	**lun 18.01.16**	**ven 05.02.16**
Fornitura	lun 18.01.16	lun 18.01.16
Montaggio	mar 19.01.16	ven 05.02.16
Generatore	**lun 14.03.16**	**gio 24.03.16**
Fornitura	lun 14.03.16	mar 15.03.16
Montaggio	mer 16.03.16	gio 24.03.16
Armadi di comando	lun 08.02.16	ven 19.02.16
Impianto di MT	lun 22.02.16	ven 11.03.16
Gru	lun 14.12.15	ven 18.12.15
Sistema di raffreddamento	lun 14.03.16	ven 01.04.16
Lavori di cablaggio	lun 04.04.16	ven 13.05.16
Messa in esercizio impianto	**ven 20.05.16**	**ven 20.05.16**
Prove a secco	lun 16.05.16	ven 27.05.16
Prove con acqua	lun 30.05.16	ven 03.06.16
Inizio esercizio impianto	lun 06.06.16	lun 06.06.16
Esercizio impianto	lun 06.06.16	ven 26.08.16
Lavori di finitura	lun 06.06.16	ven 01.07.16
Lavori di sistemazione esterna	lun 06.06.16	ven 01.07.16
